

## Hinweis.

Der zeitliche Ablauf entspricht dem Informationsstand vom 29. Januar 2019. Verzögerungen aufgrund von extremer Witterung oder unvorhergesehener Ereignisse können nicht ausgeschlossen werden.

## Baufortschritt. Aktuell.

Aktuelle Informationen zum Baufortschritt sind auf der Webseite [www.das-doernberg.de/baufortschritt](http://www.das-doernberg.de/baufortschritt) zu finden.

Für Fragen und Anmerkungen sowie um Neuigkeiten, wie z.B. Ankündigungen von Straßensperrungen, regelmäßig per E-Mail zu erhalten, können sich Interessierte an [baufortschritt@das-doernberg.de](mailto:baufortschritt@das-doernberg.de) wenden.

### Impressum

Dörnberg-Viertel Projekt GmbH & Co. KG  
Südl. Münchner Str. 42b  
82031 Grünwald  
[www.das-doernberg.de](http://www.das-doernberg.de)

### Konzeption und Gestaltung

Valentum Kommunikation GmbH  
Bischof-von-Henle-Straße 2b  
93051 Regensburg  
[www.valentum-kommunikation.de](http://www.valentum-kommunikation.de)



DAS  
DÖRN  
BERG

## Baufortschritt. Aktuell.


Informationen zum Straßenbau  
von Februar bis Mai 2019.

# Ablauf des Straßenbaus ab Frühjahr 2019



Im Februar beginnt erneut der Straßenbau in der Ladehofstraße, um das Baugebiet an den umliegenden Verkehr anzuschließen. Geplante Fertigstellung der Straße ist Juli 2019. Die Baumaßnahmen erfolgen von Westen nach Osten und werden in zwei Abschnitte unterteilt, um die Auswirkungen auf die Anwohner so gering wie möglich zu halten:

- Zunächst wird im westlichen Bereich der Straße der Anschluss an den bereits fertiggestellten Kreisverkehr hergestellt. Dieser erste Abschnitt erstreckt sich bis zur Baustellenausfahrt Tor 2, wo die ursprüngliche Ladehofstraße endet.
- Der zweite Abschnitt stellt die Verbindung zwischen der Baustellenausfahrt Tor 2 und der Hoppestraße her.

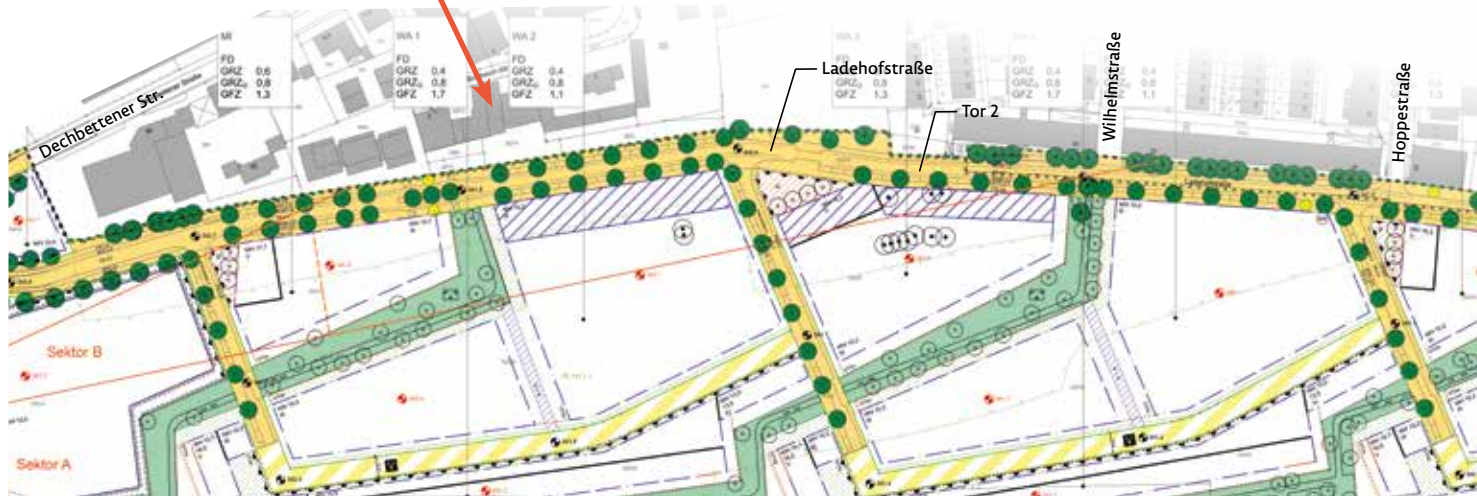

## Weitere Maßnahmen:

- Parallel zu den Straßenbaumaßnahmen erfolgt der Ausbau des nördlichen Gehwegs. Der südliche Teil entsteht in Abhängigkeit zum Fortschritt des Hochbaus im jeweiligen Abschnitt.
- Im März 2019 beginnt die innere Erschließung im letzten Bauabschnitt. Es wird zunächst die Straße hergestellt, die endgültige Fertigstellung richtet sich nach dem Bauablauf des Hochbaus.

## Bitte beachten:

Während der gesamten Bauzeit ist mit Lärm durch Baumaschinen zu rechnen. Detaillierte Informationen zum zeitlichen Ablauf sowie zu ggfs. notwendigen Sperrungen werden mit ca. zwei Werktagen Vorlauf auf der Webseite [www.das-doernberg.de/baufortschritt](http://www.das-doernberg.de/baufortschritt) bekannt gegeben. Interessierte können sich unter [baufortschritt@das-doernberg.de](mailto:baufortschritt@das-doernberg.de) registrieren, um per Mail aktuelle Informationen zu erhalten.
